

Katholische Stiftungshochschule München
Campus Benediktbeuern
Sommersemester 2026

Reflexionsbericht
„Slow Monday Running Club“

Portfoliobericht zum Praxis III - Projekt
(Modul 3.6)

von Kilian Siebert (11331)
6. Semester

Projektbegleitender Dozent: Prof. P. Dr. Bernhard Vondrášek

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	3
2 Vorbereitung und Planung	4
2.1 Projektmanagement Tools	4
2.2 Zeitliche Ressourcen	5
2.3 Herausforderungen in der Vorbereitung	6
2.4 positive Entwicklungen im Planungsprozess	7
3 Durchführung der Lauftreffs	8
3.1 Herausforderungen in der Durchführung	8
3.2 Erfolge und positive Entwicklungen	9
4 Reflexion der Zielsetzungen	10
5 Fazit	12
6 Wallpaper	13
7. Projektziele	14
7.1 persönliche Zielsetzung	14
7.2 Ziele im Bezug auf Adressat*innen	15
7.3 Ziele im Bezug auf die Hochschule als Institution	15
8. Projektstrukturplan	16
9. Netzplan	17
10. Risikoanalyse	18
10.1 Risiken in der Planung	18
10.2 Risiken am Tag der Veranstaltung	18
11. Zeitliste	20

1 Einleitung

In diesem Bericht wird das Praxis III-Projekt „Slow Monday Running Club“ reflektiert. Dabei wird zunächst der Fokus auf die Vorbereitung und Planung der Veranstaltungsreihe gelegt, bevor die Durchführung der einzelnen Lauftreffs näher betrachtet wird. In beiden Teilen werden vor allem Herausforderungen, Verbesserungsbedarfe und Erfolge thematisiert. Im Anschluss daran wird die Umsetzung der im Voraus formulierten Ziele reflektiert.

Der Slow Monday Running Club ist ein niederschwelliges, wöchentliches Laufangebot für Studierende der Hochschule Benediktbeuern. In bewusst sehr langsamem Tempo sollen Studierende unabhängig von ihrem individuellen Fitnesslevel zusammenkommen, um gemeinsam einen Ausgleich zum Studienalltag insbesondere zur belastenden Vorprüfungszeit zu finden. Im Anschluss an den Lauf findet jeweils ein Get-together statt, das den Transfer von der gemeinsamen Bewegung zum sozialen Austausch ermöglichen soll. Als Kooperationspartner für dieses Get-together fungiert das Café Otis in Benediktbeuern. Ursprünglich war hierfür im Projektsteckbrief das Kräutercafé vorgesehen; aufgrund kurzfristiger Umbauarbeiten wurde die Kooperation jedoch noch vor der Durchführung auf das Café Otis verlegt (s. hierzu auch 2.3).

Da mein eigener sportlicher Alltag stark durch das Training für Ultramarathons und einen Ironman geprägt ist und ich über meine langjährige Mitwirkung im Kulturreferat ein großes Interesse an einer lebendigen Campus-Kultur habe, lag es nahe, beide Themenfelder im Rahmen dieses Praxis III-Projekts miteinander zu verbinden. Mit dem Slow Monday Running Club wollte ich den Leistungsgedanken, der meinen eigenen Laufalltag häufig prägt, für diesen Kontext bewusst dekonstruieren und stattdessen die reine Freude an der Bewegung an der frischen Luft in den Vordergrund stellen.

Die Veranstaltungsreihe fand im Sommersemester 2026 an drei Mittwochsterminen statt am 08.06., 15.06. und 22.06.2026 und wurde jeweils von einem gemeinsamen Get-together im Café Otis abgeschlossen. Da ich dieses Format zum ersten Mal organisiert habe, bot mir das Projekt die Möglichkeit, sowohl meine eigene Haltung zum Leistungsgedanken im Sport zu reflektieren als auch erste Erfahrungen in der eigenständigen Projektplanung zu sammeln, was nun in Form dieses Reflexionsberichts dargestellt wird.

2 Vorbereitung und Planung

2.1 Projektmanagement Tools

Für die Organisation des Slow Monday Running Clubs nutzte ich in erster Linie das Projektmanagement-Tool Trello, da es verschiedene Facetten der Projektplanung abdeckt und sich praktisch auf dem Smartphone integrieren lässt. Traditionelle Instrumente wie der Projektstrukturplan (PSP) oder der Netzplan bleiben häufig ungenutzte Diagramme auf Papier. Trello macht diese Pläne dynamisch und direkt bearbeitbar.

Den Projektstrukturplan setzte ich in Trello so um, dass für jedes große Arbeitspaket wie „Öffentlichkeitsarbeit“, „Absprache mit dem Café“ oder „Routenplanung“ eine eigene Spalte angelegt wurde. Die konkreten To-Dos wurden zu einzelnen Karten, die ich über Checklisten in kleine, machbare Schritte unterteilte. So wurde die theoretische Struktur greifbar und übersichtlich.

Auch die Funktion des Netzplans ließ sich gut integrieren: Die logische Reihenfolge und die Abhängigkeiten der Aufgaben steuerte ich über klare Deadlines und farbige Markierungen für die Meilensteine. Verschoob sich zeitlich etwas was bei der Organisation eines Outdoor-Laufevents schnell vorkommen kann, musste ich nicht den gesamten Plan neu zeichnen, sondern lediglich die Frist der entsprechenden Karte anpassen.

Ergänzend nutzte ich monday.com zur digitalen Abbildung des Projektstrukturplans. Die Software übersetzt die klassische, hierarchische Baumstruktur eines PSP in ein digitales Format mit To-Do-Listen und Kalender. Über einen Top-Down-Ansatz bilden die „Gruppen“ die großen Arbeitspakete ab, während sich darunter die konkreten Teilaufgaben als „Elemente“ und „Unterelemente“ tiefengestaffelt eintragen lassen. Durch flexibel anpassbare Spalten konnten jedem Arbeitspaket zudem Prioritäten, Fristen und ein Live-Status zugewiesen werden, sodass die Struktur des Projekts jederzeit im Fokus bleibt.

Für die Kommunikation mit den Teilnehmenden nutzte ich die bestehende Studierenden Whatsapp Gruppe, über die kurzfristige Informationen – etwa bei spontanen Wetteränderungen oder Absagen – schnell an alle Beteiligten weitergegeben werden konnten. Die Laufstrecken (5 km, 6 km und 7 km) plante ich frühzeitig über die App Komoot und speicherte sie ab, sodass sie am jeweiligen Lauftag direkt abrufbar waren.

2.2 Zeitliche Ressourcen

Zur Erfassung der aufgewendeten Arbeitszeiten für den Lauftreff in Benediktbeuern nutzte ich primär eine Notiz-App auf meinem Smartphone. Dies ermöglichte es mir, die Zeiten flexibel und unmittelbar nach den jeweiligen Tätigkeiten festzuhalten, bevor sie abschließend in eine finale Übersicht übertragen wurden (eine ausgefüllte Übersicht der investierten Zeit findet sich in Anlage 6.7).

Während sich klassische Organisationsaufgaben und offizielle Vorbereitungstreffen zeitlich sehr präzise dokumentieren ließen, gestaltete sich die Erfassung bei anderen Tätigkeiten deutlich schwieriger. Insbesondere die „Mundpropaganda“ am Campus zur Gewinnung neuer Teilnehmender, informelle Gespräche sowie spontane Absprachen, die sich oft ganz natürlich während meines eigenen Studiums ergaben, verschwammen zeitlich. Diese Aufwände ließen sich im Nachhinein nur schwer als exakte Projektarbeitszeit abgrenzen und quantifizieren.

Vergleicht man den tatsächlichen Aufwand mit der anfänglichen Planung, fiel die investierte Zeit ähnlich aus als ursprünglich veranschlagt. Vor allem die Betreuung der Teilnehmenden und die Koordination der Laufgruppe forderten mehr Präsenz als gedacht. Dies führte mitunter zu Engpässen, da meine zeitlichen Ressourcen durch verschiedene parallele Verpflichtungen stark beansprucht wurden. Neben den regulären Anforderungen meines Studiums erforderten auch mein eigenes Lauftraining sowie meine Aufgaben in der Klausurenphase viel Zeit und Energie, was ein striktes Zeitmanagement unabdingbar machte.

Rückblickend stellt sich die Frage nach der optimalen Taktung innerhalb des Sommersemesters. Zwar ist die warme Jahreszeit für einen Outdoor-Lauftreff in Benediktbeuern sehr einladend, jedoch erwiesen sich die teils hochsommerlichen Temperaturen in den späteren Projektwochen als physische Herausforderung für die Gruppe. Für zukünftige Durchläufe wäre es daher sinnvoller, entweder primär auf den Frühsommer zu fokussieren oder die Laufzeiten strikter in die kühleren, frühen Morgen- oder späten Abendstunden zu verlegen, um die Belastung für die Teilnehmenden geringer zu halten und die Motivation dauerhaft hochzuhalten.

2.3 Herausforderungen in der Vorbereitung

Neben den unter 2.4 beschriebenen Erfolgen begegneten mir im Rahmen der Planung und Organisation einige Herausforderungen, welche im Folgenden hinsichtlich ihres Verbesserungsbedarfes geprüft werden.

Eine zentrale Herausforderung in der Vorbereitungsphase betraf die Kooperation mit dem ursprünglich vorgesehenen Café als Anschlussort für das Get-together. Im Projektsteckbrief war hierfür zunächst das Kräutercafé vorgesehen. Dieses stand zur vorgesehenen Zeit jedoch aufgrund laufender Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung, sodass die Kooperation noch vor Beginn der Durchführung auf das Café Otis in Benediktbeuern verlegt werden musste.

Diese Erfahrung unterstreicht die in der Risikoanalyse bereits angelegte Notwendigkeit, frühzeitig telefonische Absprachen mit Kooperationspartner*innen zu treffen und einen Plan B bereitzuhalten, falls ein Vorhaben kurzfristig nicht wie geplant umsetzbar ist.

Auch bei der Routenplanung zeigte sich eine kleinere Herausforderung: Da mir die Wege rund um Benediktbeuern aus meinem eigenen, regelmäßigen Lauftraining bereits gut bekannt sind, gestaltete sich die grundsätzliche Streckenplanung recht einfach. Schwieriger war es jedoch, Rundstrecken zu finden, die der gewünschten Länge (5 km, 6 km bzw. 7 km) entsprachen und dabei sowohl an der Mensa starteten als auch am Café Otis endeten.

Verbesserungsbedarf sehe ich rückblickend vor allem bei der Öffentlichkeitsarbeit: Die Werbung über bestehende WhatsApp- und Studierendengruppen war zwar grundsätzlich hilfreich, allein jedoch nicht ausreichend, um eine größere Reichweite zu erzielen. Für künftige Durchführungen würde ich stärker auf persönliche Ansprache und Mundpropaganda sowie ggf. weitere Werbeideen (z. B. Aushänge, direkte Ansprache in Lehrveranstaltungen) setzen.

Mit Blick auf die eingesetzten Planungstools zeigte sich zudem, dass monday.com mit seinem umfangreichen Funktionsumfang für ein Projekt dieser Größenordnung teilweise etwas überdimensioniert war.

2.4 positive Entwicklungen im Planungsprozess

Trotz der unter 2.3 beschriebenen kurzfristigen Umplanung des Kooperationspartners verlief die Zusammenarbeit mit dem Café Otis äußerst unkompliziert: Nach einer anfänglichen Absprache reichte es aus, vor dem jeweiligen Lauf kurz im Café anzurufen, damit dort bekannt war, wie viele Plätze freigehalten bzw. vorbereitet werden mussten. Die Kooperation erwies sich dabei als Win-win-Situation: Auch für das Café Otis stellte sie eine gute Werbung dar, da Studierende, die einmal dort waren, anschließend häufiger von sich aus wiederkamen.

Auch die Nutzung von Trello hat sich aus meiner Sicht voll bewährt: Sämtliche Planungsdaten jederzeit auf dem Smartphone griffbereit zu haben, war im Studienalltag ein großer Vorteil und hat die Organisation insgesamt deutlich erleichtert.

3 Durchführung der Lauftreffs

3.1 Herausforderungen in der Durchführung

Wie in der Risikoanalyse (s. Anlage 6.6.2) bereits antizipiert, zeigte sich während der Durchführung ein Leistungsgefälle zwischen den Teilnehmenden: Trotz des bewusst langsam gewählten Tempos sorgten unterschiedliche Fitnesslevel für spürbare Unterschiede innerhalb der Gruppe. Dem gemeinsamen Spaß und der Freude an der Bewegung tat dies jedoch keinen Abbruch.

Die Pace gab dabei überwiegend ich selbst als Pacemaker vor; ein gesondertes Zwei-Pacemaker-Konzept kam nicht zum Einsatz. Häufig liefen wir sogar noch etwas langsamer als ursprünglich geplant mit einem Tempo von rund 7:00 min/km, was dem gemeinsamen Erlebnis keinen Abbruch tat.

Eine weitere Herausforderung ergab sich aus dem bewusst niederschwellig ohne verbindliche Anmeldung gestalteten Format: Während dies für einen Teil der Studierenden den entscheidenden Vorteil darstellte, spontan und ohne Verpflichtung teilnehmen zu können, empfanden andere es als Hürde, im Vorfeld nicht zu wissen, wer und wie viele Personen tatsächlich kommen würden.

Mit dem Wetter hatte ich an allen drei Terminen großes Glück: Bis auf leichten Nieselregen blieben die Lauftreffs von nennenswerten Wettereinflüssen verschont. Auch die starke Sonneneinstrahlung am ersten Durchführungstag stellte kein Problem dar, da die gewählte Strecke überwiegend durch schattige Bereiche führt. Verletzungen oder gesundheitliche Zwischenfälle gab es zu meiner großen Erleichterung an keinem der drei Termine.

3.2 Erfolge und positive Entwicklungen

Insgesamt lässt sich die Durchführung der drei Lauftreffs als Erfolg bewerten. Die Teilnehmendenzahlen entwickelten sich über die drei Termine hinweg durchgehend positiv: Während beim ersten Lauftreff lediglich fünf Personen mitliefen, waren es beim zweiten Termin bereits sieben und beim dritten Termin sogar neun Teilnehmende. Diese kontinuierliche Steigerung werde ich als deutliches Zeichen dafür, dass sich der Lauftreff innerhalb kurzer Zeit als fester Bestandteil im wöchentlichen Rhythmus einiger Studierender etablieren konnte.

Besonders bemerkenswert war zudem, dass regelmäßig auch weniger laufaffine Studierende direkt zum Get-together ins Café Otis kamen, ohne zuvor am Lauf teilgenommen zu haben. Das anschließende Beisammensein im Café Otis funktionierte hervorragend – teilweise waren dort sogar mehr Studierende anwesend als beim Lauftreff selbst. Es entstanden viele Gespräche mit Personen, mit denen ich sonst eher nicht ins Gespräch gekommen wäre, was den im Vorfeld formulierten Zielen der sozialen Vernetzung (s. Anlage 6.3.2) in besonderem Maße entsprach.

Ein weiterer Erfolg war, dass mich Studierende von sich aus ansprachen und fragten, ob der Lauftreff auch nach Abschluss des Praxis III-Projekts fortgeführt werde. Dieses Interesse werde ich als starkes Indiz dafür, dass das Format einen echten Bedarf bei den Studierenden trifft und perspektivisch über das Projekt hinaus Bestand haben könnte.

4 Reflexion der Zielsetzungen

Im Folgenden werden nun die Projektziele (s. Anlage 6.3) auf ihre Realisierung hin überprüft.

Bezüglich meiner persönlichen Ziele lässt sich festhalten, dass diese teilweise erreicht wurden. Das Ziel, den eigenen Leistungsgedanken für diesen Kontext zu dekonstruieren, konnte ich nur bedingt umsetzen: Mein eigener Leistungsgedanke ist dadurch nicht spürbar geringer geworden, vielmehr wurde mein eigener Sportalltag durch die Organisation und Durchführung des Lauftreffs schwieriger zu strukturieren.

Deutlich besser gelungen ist hingegen das Ziel, die eigene Begeisterung am Laufsport an andere weiterzugeben: Viele Studierende kommunizierten mir gegenüber, auch über die Lauftreffs hinaus laufen gehen zu wollen, oder sind bereits unabhängig davon aktiv mit dem Laufen gestartet. Inwiefern andere Personen dadurch auch in ihrer Lebensbewältigung profitieren wie es für mich selbst der Fall ist lässt sich nur schwer einschätzen. Sofern der Sport jedoch weiterverfolgt wird, bestehen aus meiner Sicht gute Chancen, ähnliche positive Erfahrungen zu machen.

Mit Blick auf das Ziel, einen Beitrag zur Campus-Kultur zu leisten, zeigte sich ein differenziertes Bild: Der Lauftreff stellt ähnlich wie viele andere regelmäßige Angebote eine sinnvolle Ergänzung des studentischen Lebens dar. Um jedoch tatsächlich einen größeren Beitrag zum „Standortfaktor“ Campus Benediktbeuern zu leisten, müsste das Format aus meiner Sicht noch deutlich besser etabliert werden. Beispielsweise als Bestandteil des offiziellen Hochschulsports.

Hervorragend funktioniert hat hingegen das „Kopf-frei-Bekommen“ im Café Otis im Anschluss an den Lauf.

Auch bei den Zielen im Bezug auf die Adressat*innen zeigte sich ein gemischtes, insgesamt aber positives Bild. Die Niederschwelligkeit des Angebots insbesondere der Verzicht auf eine verbindliche Anmeldung erwies sich dabei sowohl als Stärke als auch als Herausforderung: Für einen Teil der Studierenden war es ein wichtiger Pluspunkt, ohne vorherige Anmeldung einfach „auftauchen“ zu können. Für andere wiederum stellte gerade diese Unverbindlichkeit eine Hürde dar, da im Vorfeld nicht klar war, wer und wie viele Personen tatsächlich teilnehmen würden.

Das Ziel, sportlichen Druck vollständig aus dem Format herauszunehmen, wurde nur teilweise erreicht: Durch ein deutliches Leistungsgefälle zwischen den Teilnehmenden entstanden zwangsläufig Unterschiede innerhalb der Gruppe. Dies minderte jedoch den gemeinsamen Spaß und die Freude an der Bewegung nicht.

Uneingeschränkt erreicht wurde hingegen das Ziel der sozialen Vernetzung im Anschluss an den Lauf: Das Get-together im Café Otis funktionierte wie bereits unter 3.2 beschrieben fantastisch und bot einen Rahmen für Begegnungen, die ohne den Lauftreff in dieser Form vermutlich nicht zustande gekommen wären.

Die Ziele im Bezug auf die Hochschule als Institution lassen sich aus den oben beschriebenen Beobachtungen ableiten. Mit Blick auf die im Projektsteckbrief definierten Erfolgsfaktoren (s. Anlage 6.2) zeigt die kontinuierlich steigende Teilnehmendenzahl (5 – 7 – 9 Personen) eine positive Tendenz bei der Teilnehmerquote. Die Verbindungsrate – also der Anteil der Läufer*innen, die im Anschluss tatsächlich am Get-together teilnahmen war durchgehend sehr hoch; teilweise stießen sogar zusätzliche Studierende direkt im Café dazu, ohne zuvor gelaufen zu sein. Auch der Vernetzungsgrad lässt sich als deutlich erreicht einordnen, da im Café Otis regelmäßig neue soziale Kontakte zwischen Studierenden entstanden, die sich zuvor nicht oder kaum kannten.

In der Gesamtschau trägt der Slow Monday Running Club damit zur sozialen Revitalisierung des Campus bei auch wenn, wie unter den persönlichen Zielen beschrieben, eine längerfristige Etablierung notwendig wäre, um diesen Effekt nachhaltig zu verstärken.


5 Fazit

Abschließend lässt sich festhalten, dass mir das Projekt „Slow Monday Running Club“ einen gelungenen Einstieg in die strukturierte Projektarbeit ermöglicht hat. Insgesamt schätze ich das Projekt als erfolgreich ein, auch wenn mir bewusst ist, dass die Community laufbegeisterter Menschen an einem so kleinen Ort wie Benediktbeuern naturgemäß nicht riesengroß ist. Mit den Studierenden, die ich erreichen konnte, bin ich daher sehr zufrieden, zumal mehrere Teilnehmende zu späteren Terminen wiederkamen und dabei eigene Freund*innen mitbrachten für mich ein deutliches Zeichen dafür, dass das Format positiv aufgenommen wurde. Ich gehe davon aus, dass das Wachstumspotenzial bei einer längeren Projektlaufzeit noch erheblich größer gewesen wäre.

Besonders deutlich wurde für mich, dass sich der von mir anvisierte Perspektivwechsel weg vom Leistungsgedanken, hin zur reinen Freude an der Bewegung nicht vollständig auf meinen eigenen sportlichen Alltag übertragen ließ, wohl aber im Rahmen des Lauftreffs für andere erfahrbar gemacht werden konnte. Die kontinuierlich steigenden Teilnehmendenzahlen, die vielen neuen Kontakte im Café Otis und nicht zuletzt die Nachfrage Studierender nach einer Fortführung zeigen, dass das Format einen echten Mehrwert für das studentische Leben am Campus Benediktbeuern bieten kann.

Eine zentrale Erkenntnis betrifft das gewählte Lauftempo: Auf dem Plakat hatte ich ein Tempo von rund 6:30 min/km angekündigt tatsächlich liefen wir die meisten Strecken mit etwa 7:00 min/km, also bereits etwas langsamer als angegeben. Dennoch war dieses Tempo für einige Teilnehmende noch zu schnell. Rückblickend war ich hier von meiner eigenen Perspektive als ambitionierter Hobbysportler etwas „verblendet“ und habe das tatsächlich notwendige, niederschwellige Tempo zunächst unterschätzt. Für eine künftige Durchführung würde ich daher ein noch langsames Tempo wählen und dieses bereits auf dem Plakat entsprechend ankündigen. Insgesamt glaube ich, dass sich viele Menschen für den Laufsport begeistern lassen, wenn man sie entsprechend abholt dafür braucht es vor allem Zeit.

6 Wallpaper



7. Projektziele

7.1 persönliche Zielsetzung

Für dieses Praxis III-Projekt habe ich mir das persönliche Ziel gesetzt, den Leistungsgedanken, der meinen eigenen sportlichen Alltag durch das Ultramarathontraining oft prägt, für diesen Kontext zu dekonstruieren. Mein Ziel ist es, meine tiefgreifende Leidenschaft für das Laufen und den Ausdauersport so zu transformieren, dass nicht Zeiten, Wettkämpfe oder Distanzen im Vordergrund stehen, sondern die reine Freude an der Bewegung an der frischen Luft.

Mir ist es ein großes Anliegen, Begeisterung am Sport weiterzugeben, weil ich persönlich in großem Maße vom Laufsport profitieren konnte und meine Lebensbewältigung erheblich durch den Laufsport geprägt ist. Ich möchte diese Ressource anderen Leuten vermitteln.

Darüber hinaus ist es für mich eine zentrale Intention, den Fokus auf die Gemeinschaft zu legen. Durch meine langjährige Mitwirkung im Kulturreferat liegt mir die Förderung einer lebendigen Campus-Kultur besonders am Herzen. Mich beschäftigt schon länger intensiv die Frage, wie das studentische Leben wieder als echter, kultureller Begegnungsraum gestaltet werden kann. Mein Ziel ist es, durch die Organisation des Run-Clubs proaktiv dazu beizutragen, den Campus Benediktbeuern wieder zu einem aktiven Zentrum für Studierende zu machen. Es soll ein Ort sein, an dem es sich lohnt, vor Ort Präsenz zu zeigen, weil ein echtes Studentenleben existiert. Ein weiteres persönliches Ziel ist es dabei, das Projekt organisatorisch so aufzubauen, dass ich selbst den Lauf und das anschließende Get-together im Café Otis genießen und – ganz im Sinne des Ausgleichs – gemeinsam mit den anderen den Kopf frei bekommen kann.

7.2 Ziele im Bezug auf Adressat*innen

In Bezug auf die teilnehmenden Studierenden verfolge ich das primäre Ziel, einen niederschweligen Ausgleich zum teilweise defizitorientierten und vollen Studienalltag zu schaffen, insbesondere als mentaler Ausgleich während der stressigen Vorprüfungszeit. Die Adressatinnen und Adressaten sollen die Möglichkeit erhalten, unkompetitiv und ohne jeden sportlichen Druck zusammenzukommen, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Das bewusst sehr langsam gewählte Tempo dient dabei als zentrales Instrument für Teilhabe und Inklusion. Dies stellt sicher, dass die Partizipation nicht an sportlichen Hürden scheitert, sondern das Gemeinschaftserlebnis vollkommen unabhängig vom individuellen Fitnesslevel im Vordergrund steht.

Ein weiteres Ziel ist die soziale Vernetzung. Der Run-Club soll nicht nur physische Aktivität initiieren, sondern als Katalysator für soziale Interaktion fungieren. Der Transfer von der physischen Aktivität zum sozialen Austausch soll im Café Otis in Benediktbeuern stattfinden. Das Ziel ist erreicht, wenn aus der gemeinsamen sportlichen Aktivität ein sozialer Austausch entsteht, in dem lockeres Laufen als Werkzeug für Mental Health und den Ausgleich zum Studium fungiert.


7.3 Ziele im Bezug auf die Hochschule als Institution

Für die Hochschule als Institution zielt das Projekt auf eine soziale Revitalisierung des Campus Benediktbeuern ab. In einer Zeit, in der sich das studentische Leben oft in den privaten oder digitalen Raum verlagert, soll die Hochschule durch kollektive Aktivitäten wieder als attraktiver, lebensweltorientierter Begegnungsort wahrgenommen werden. Das Ziel ist es, durch die Belebung des Campus einen Beitrag zur Hochschulkultur zu leisten. Das Projekt soll aufzeigen, dass die Institution Raum für studentische Entfaltung bietet und soziale Begegnungsräume fördert, um die Vernetzung der Studierenden am Campus zu stärken. Ein aktives Studentenleben mit Angeboten und vielseitigen Möglichkeiten der Teilhabe ist ebenso wichtig für neue Studierende wie beispielsweise die Qualität der Lehre.

8. Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan wurde – wie unter 2.1 beschrieben – in Trello umgesetzt. Die folgende Übersicht fasst die wesentlichen Arbeitspakete zusammen:

 Projektdokumentation und Planung • Projektmanagement-LV • Brainstorming • Ablaufplan • Absprachen mit Hr. Vondrásek • Risikoanalyse	 Öffentlichkeitsarbeit • Grafikdesign Wallpaper/Plakat • Drucken des Wallpapers • Versand von Werbenachrichten	 Kooperation Café Otis • Café Otis abtelefonieren • Kooperation klären (Kapazitäten) • Umfang/Kapazitätsplanung kommunizieren
 Routenplanung der Strecken • 5-km-Route in Komoot erstellen • 6-km-Route in Komoot erstellen • 7-km-Route in Komoot erstellen	 Projektumsetzung und Durchführung • Lauf am 08.06.2026 • Lauf am 15.06.2026 • Lauf am 22.06.2026 • Get-together im Café Otis	 Evaluierung und Nachbereitung • Reflexionsbericht • Kolloquium

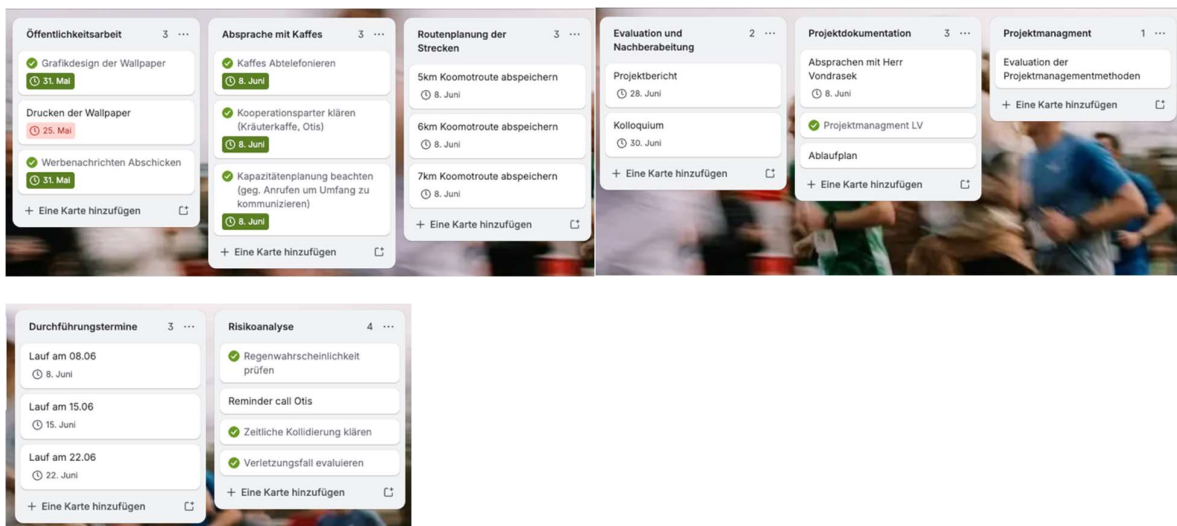

9. Netzplan

Der Netzplan bzw. Meilensteinplan wurde digital über monday.com abgebildet (s. 2.1). Die folgende Tabelle zeigt die zentralen Meilensteine im zeitlichen Verlauf:

Datum	Meilenstein
04.05.2026	Projektbeginn
31.05.2026	Start der Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichung der Werbung)
01.06.2026	Verbindliche Zusage des Cafés (Café Otis, Benediktbeuern)
06.06.2026	Fertigstellung der Routenplanung (5 km, 6 km, 7 km)
08.06.2026	Quality Gate
08.06.2026	Durchführung – Kick-off-Lauf
15.06.2026	Durchführung – zweiter Lauf
22.06.2026	Durchführung – voraussichtlicher Abschluss-Lauf
28.06.2026	Abgabe Projektbericht
30.06.2026	Kolloquium und offizielles Projektende

▼ To-do

☐	Aufgabe	Verantwor...	Status ⓘ	Fälligkeitsdat... ⓘ	Hinweise	Zeitleiste ⓘ	+
☐	Veröffentlichung der Werb...		Erledigt	ⓘ Mai-31		! Mai 31	
☐	Projektbeginn		Erledigt	ⓘ Mai-4	Aktionselemente	! Mai 4	
☐	Zusage der Kaffes		Erledigt	✓ Juni-1		✓ Juni 1	
☐	Fertigstellung der Routenpl...		Erledigt	✓ Juni-6	Sonstiges	✓ Juni 6	
☐	• Meilenstein der Durchfüh...		Start ausstehend	ⓘ Juni 8		Juni 8	
☐	• Meilenstein der Durchfüh...		Start ausstehend	ⓘ Juni 15		Juni 15	
☐	• Meilenstein der Durchfüh...		Start ausstehend	ⓘ Juni 22		Juni 22	
☐	• Abgabe Projektbericht		In Bearbeitung	ⓘ Juli 28		Juni 28	
☐	• Kolloquium und offizielles...		In Bearbeitung	ⓘ Juni 30		Juni 30	
☐	+ Aufgabe hinzufügen						

Mai 4 - Juli 28
Mai 4 - Juni ...

10. Risikoanalyse

10.1 Risiken in der Planung

Zeitverzug bei der Vorbereitung (z. B. Routenplanung, Öffentlichkeitsarbeit)

Eintrittswahrscheinlichkeit: niedrig bis mittel

Auswirkung: mittel

Maßnahmen zur Minimierung:

- Nutzung digitaler Projektmanagement-Tools (Trello/monday.com) zur konsequenten Fristenüberwachung
- Priorisierung der Meilensteine
- Laufrouten (5 km, 6 km, 7 km) frühzeitig in Komoot erstellen und abspeichern

Probleme bei der Kooperation mit dem Café Otis (z. B. fehlende Platzkapazitäten)

Eintrittswahrscheinlichkeit: niedrig

Auswirkung: hoch (gefährdet das Ziel des anschließenden sozialen Austauschs)

Maßnahmen zur Minimierung:

- Frühzeitige telefonische Absprache zur Klärung der Zusammenarbeit
- Möglichen Umfang der Gruppe (Kapazitätsplanung) transparent kommunizieren
- Plan B bereithalten (Verlegung auf Campus-Grünflächen bei gutem Wetter)

10.2 Risiken am Tag der Veranstaltung

Extreme Wetterbedingungen (Starkregen, Unwetter oder enorme Hitze)

Eintrittswahrscheinlichkeit: mittel

Auswirkung: mittel bis hoch

Maßnahmen zur Minimierung:

- Wetterprognose in den Tagen vor den Läufen prüfen
- WhatsApp-Community/Gruppe für rasche Kommunikationswege und kurzfristige Absagen nutzen
- Bei leichterem Regen Laufstrecke flexibel in geschütztere Waldgebiete verlegen

Verletzungen oder medizinische Notfälle während des Laufs

Eintrittswahrscheinlichkeit: niedrig bis mittel

Auswirkung: hoch

Maßnahmen zur Minimierung:

- Erste-Hilfe-Ausstattung (Basic-Set) im Laufrucksack mitführen
- Routen so planen, dass ein vorzeitiger Abbruch und Rückweg zum Campus jederzeit möglich ist
- Bewusst sehr niedriges Tempo vorgeben, um Überforderung aktiv zu vermeiden

Krankheitsausfall der Projektleitung / des Pacemakers

Eintrittswahrscheinlichkeit: gering

Auswirkung: hoch

Maßnahmen zur Minimierung:

- Person als Projektleitungs-Vertretung (zweiter Pacemaker) im Voraus anfragen
- Routen und Ablaufplan dokumentieren und teilen, um eine problemlose Übernahme zu ermöglichen

Leistungsgefälle und Spaltung der Laufgruppe

Eintrittswahrscheinlichkeit: mittel

Auswirkung: mittel (gefährdet das Projektziel der Inklusion)

Maßnahmen zur Minimierung:

- Vor dem Start klare Kommunikation der „No-Drop“-Regel (niemand wird zurückgelassen)
- Zwei Pacemaker einsetzen: Einer führt das Feld im moderaten Tempo an, der andere bildet verlässlich das Schlusslicht

11. Zeitliste

Die folgende Tabelle dient der Dokumentation der investierten Arbeitszeit und kann analog zur Zeitliste von Frau Kober (Anlage 6.9 ihres Berichts) ausgefüllt werden.

Minuten	Tätigkeit	Datum
480	Projektmanagement - LV	März
240	Vorarbeit Reflexion mit Kommilitonen	Mai
170	Brainstorming	Mai
40	Gespräch Vondrasek	04.05
340	Ausernandersetzung PM. Tools	19.05
350	Projektmanagementtool Implementierung Trello	20.05
380	Ausernandersetzung PM. Tools	20.05
240	Projektmanagementtool Implementierung Monday	21.05
15	Erstes Gespräch Projektpartner	26.05
120	Akquirieren Studierender	26.05
60	Dokumentation für Quality Gate	26.05
10	Klärung Projektpartner, Telefonat	28.05
200	Dokumente Quality Gate	30.05
240	Dokumente Quality Gate	30.05
160	Dokumente Quality Gate	30.05
180	Flyer erstellen	30.05
90	Flyer erstellen	31.05
-	Öffentlichkeitsarbeit, wake up call Studis	04.06

Minuten	Tätigkeit	Datum
180	Akquirieren Studierender	03,04,05.06
200	Durchführung 1	08.06
30	Gespräch Vondrasek, Quality gate	08.06
30	Kommunikation Whatsapp gruppen	08.06
180	Durchführung 2	15.06
15	Werbung, wake up call	15.06
190	Durchführung 3	22.06
180	Reflexionsbericht	22.06
380	Reflexionsbericht	23.06
250	Reflexionsbericht	24.06
300	Reflexionsbericht	25.06
120	Reflexionsbericht	26.06
30	Kolloquium	30.06
5415	Gesamte Minutenzahl	
